


MASTERPLAN DILBEEKSE KERN

VOORBEREIDENDE WERKEN

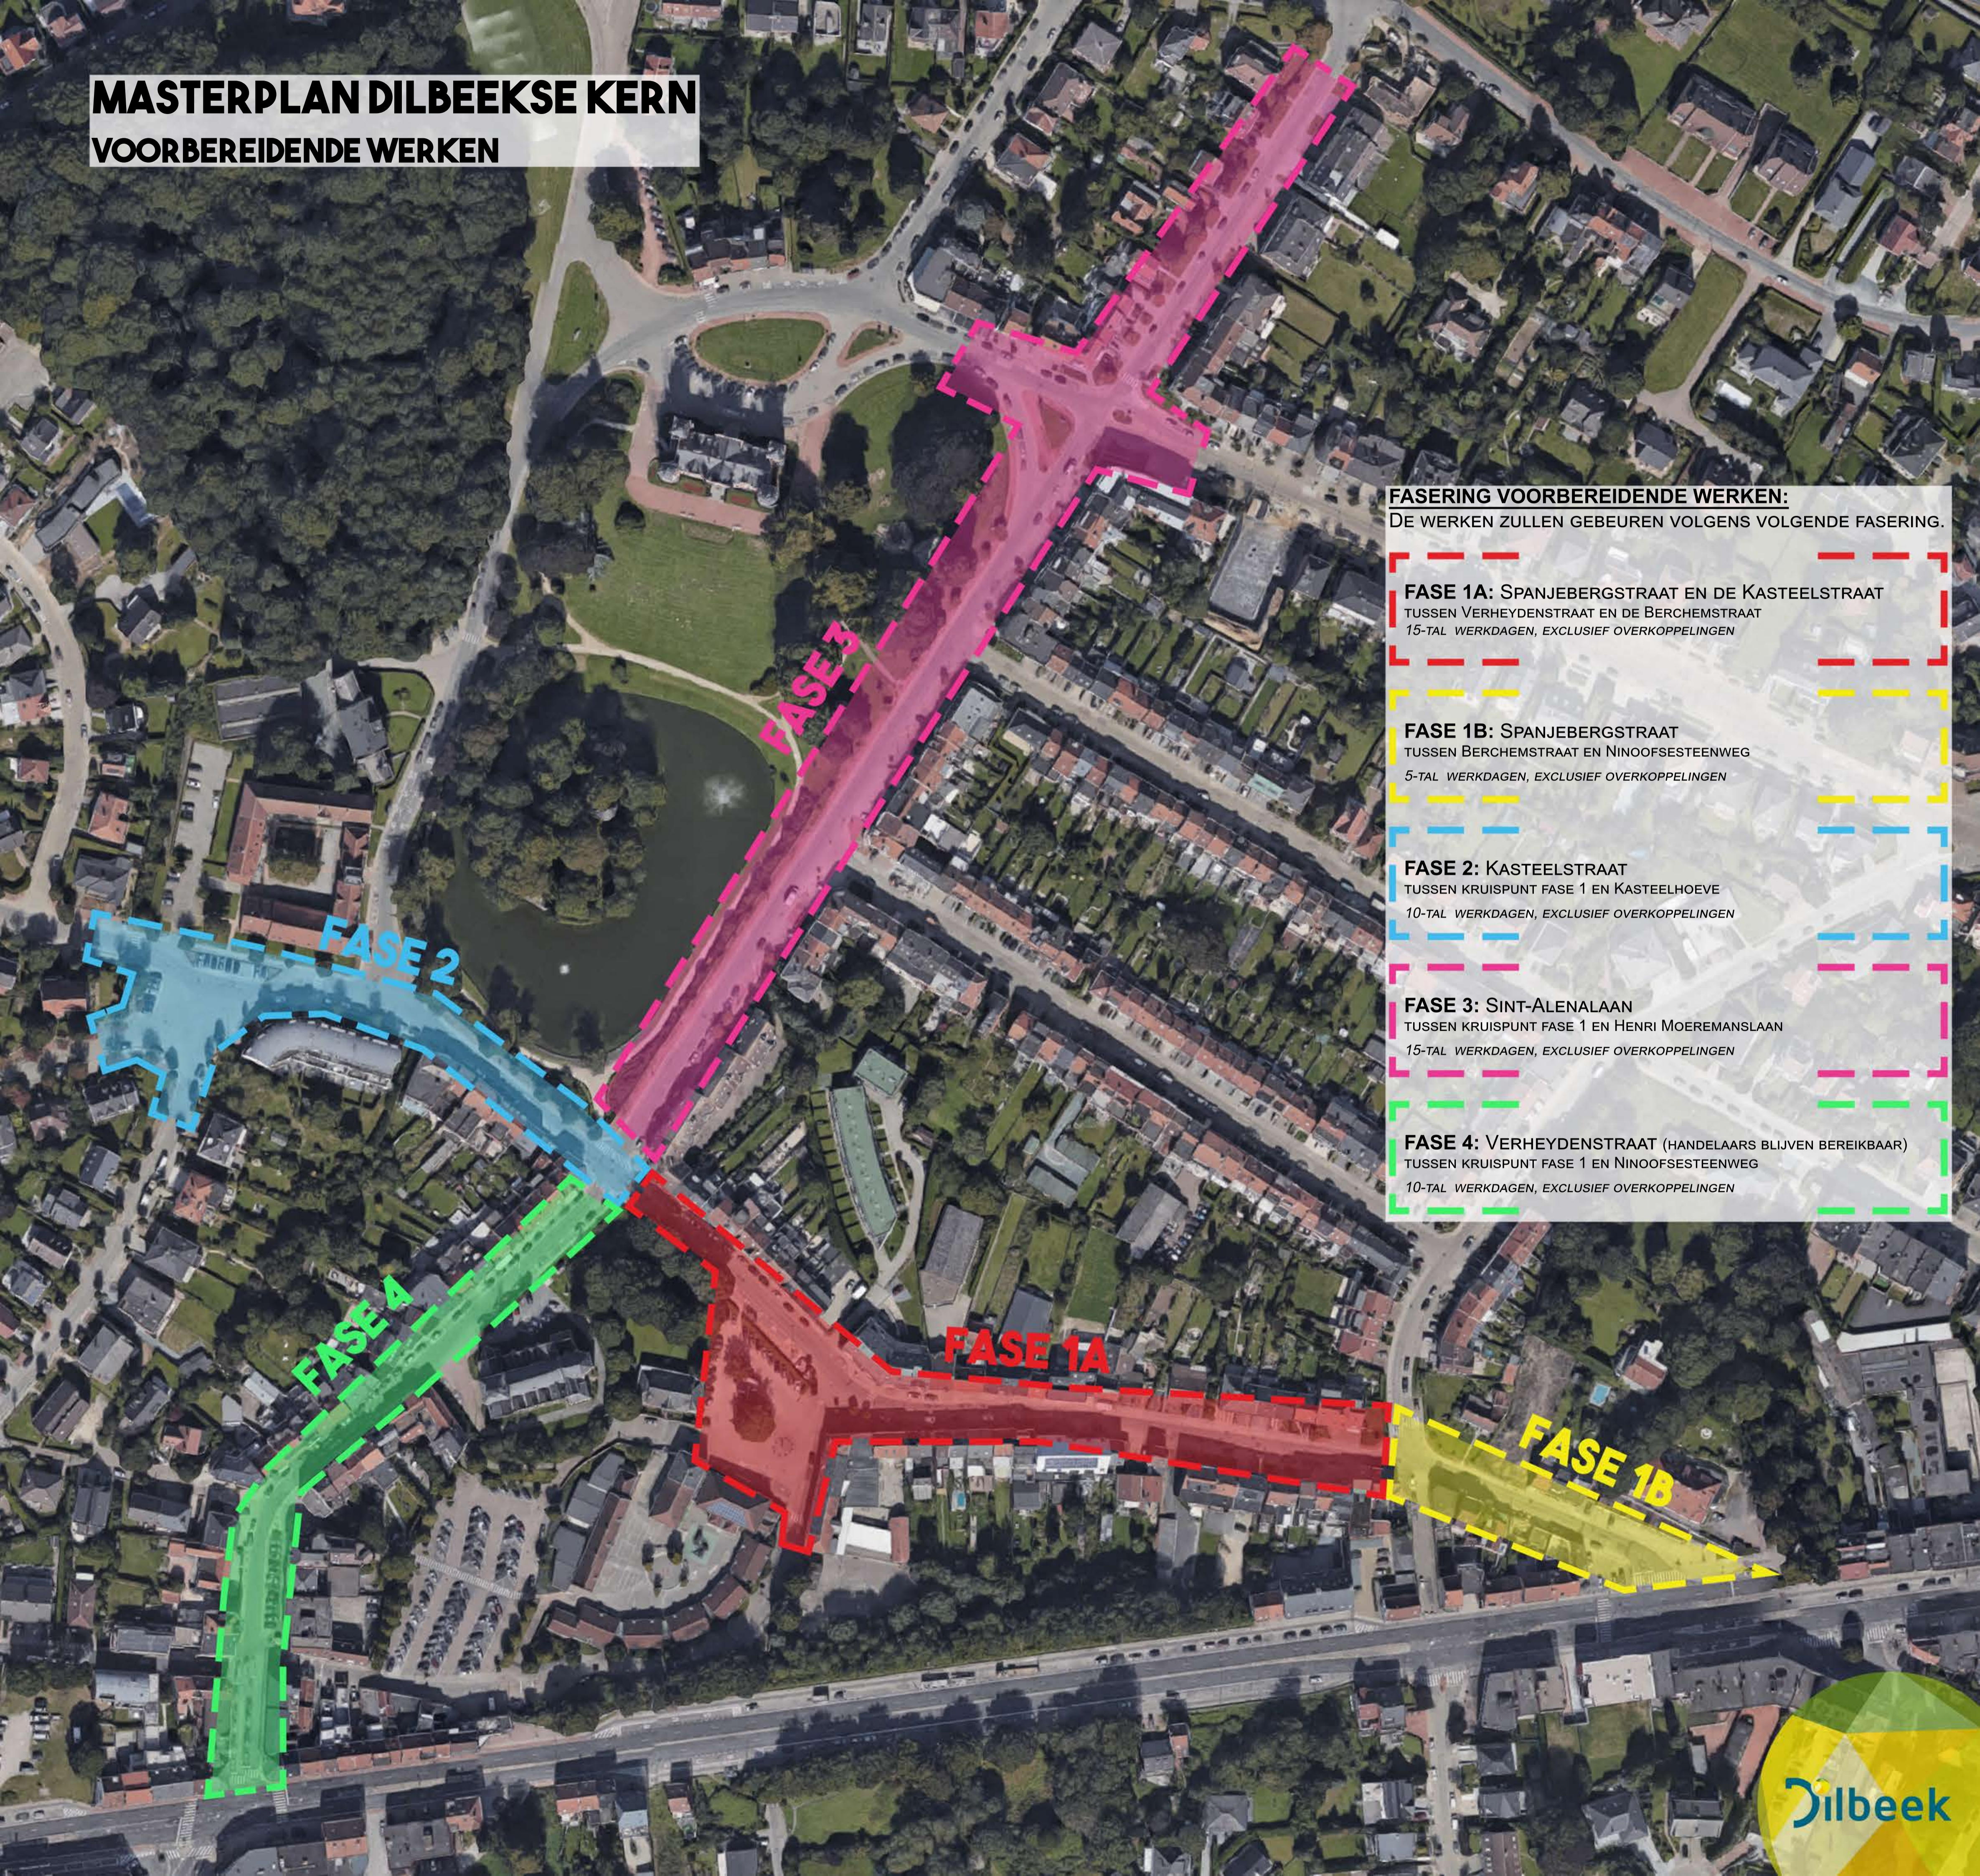

FASERING VOORBEREIDENDE WERKEN:

DE WERKEN ZULLEN GEBEUREN VOLGENS VOLGENDE FASERING.

FASE 1A: SPANJEBERGSTRAAT EN DE KASTEELSTRAAT
TUSSEN VERHEYDENSTRAAT EN DE BERCHEMSTRAAT
15-TAL WERKDAGEN, EXCLUSIEF OVERKOPPELINGEN

FASE 1B: SPANJEBERGSTRAAT
TUSSEN BERCHEMSTRAAT EN NINOOFSESTEENWEG
5-TAL WERKDAGEN, EXCLUSIEF OVERKOPPELINGEN

FASE 2: KASTEELSTRAAT
TUSSEN KRUISPUNT FASE 1 EN KASTEELHOEVE
10-TAL WERKDAGEN, EXCLUSIEF OVERKOPPELINGEN

FASE 3: SINT-ALENALAAN
TUSSEN KRUISPUNT FASE 1 EN HENRI MOEREMANSLAAN
15-TAL WERKDAGEN, EXCLUSIEF OVERKOPPELINGEN

FASE 4: VERHEYDENSTRAAT (HANDELAARS BLIJVEN BEREIKBAAR)
TUSSEN KRUISPUNT FASE 1 EN NINOOFSESTEENWEG
10-TAL WERKDAGEN, EXCLUSIEF OVERKOPPELINGEN
